



# KS Fiks folkeregister

Leverandørmøte mandag 15. november 2021



# Agenda

1. Test i modernisert Folkeregister ved Margrethe M. Bedregal
2. Prosjektstatus
3. Leveranseplan våren 2022
4. Evaluering

# Deltakere

Alle leverandørene vi har kontaktinformasjon til, er invitert til møtet:

- Tieto Evry
  - Visma
  - Acos
  - Red Rock
  - Cowi
  - KnowIT
  - Edge Consulting
  - Vigilo
  - IST
  - Sikri
  - Framweb
  - Vigo IKS
  - Digitalmedarbeider
  - Volue
  - Vigodrift
  - Everbridge
  - WebofficeOne
  - Bibliofil
  - Vitec software (HK data)
  - Norkart
- Ingen nye leverandører

# Prosjekt Fiks folkeregister

Statusrapport 26. oktober 2021

## Forrige periode

- Det er nå 248 (247) kommuner/FK som bruker tjenesten
- Prosjektet har levert leveransen til Q3 som planlagt 30. september med nytt API for oppvekst
- Acos, TietoEvry, Sikri, Visma, IST og Cowi tar i bruk Fiks folkeregister for noen av sine fagsystemer i løpet av 2021
- Det er sendt ut informasjon om kommunens forhold til bruk av infotorg-tjenester i 2022 og om utbredelse av Fiks folkeregister på ks.no

## Neste periode

- Testing av sentral tilgangsstyring pågår sammen med Lillestrøm kommune, leveranse Q4
- Arbeider med prioriterte brukerbehov for enklere saksbehandling og dynamisk bestilling av innbyggerlister
- Notat til SIKT om lovarbeid og erfaringer med samarbeid Skatteetaten
- Oppfølging brukerstøtte, kommuner, regionale nettverk, IKT-samarbeid og leverandører

## Status



### PROSJEKT

Prosjektet leverer som planlagt innenfor de leveransene som er avtalt. Arbeider med utbredelse hos kommuner og leverandører.



### PLAN

Jobber etter overordnet plan for leveranser i 2021. Foreslår å utvide prosjektet med 6 måneder.



### OMFANG


Kommunens forhold til infotorg etter 31.12.2021 er avklart og kommunisert



### RESSURS

Vi har nødvendig tilgang til ressurser og ønsker å fortsette med tilsvarende bemanning inn i 2022.

## Risiko

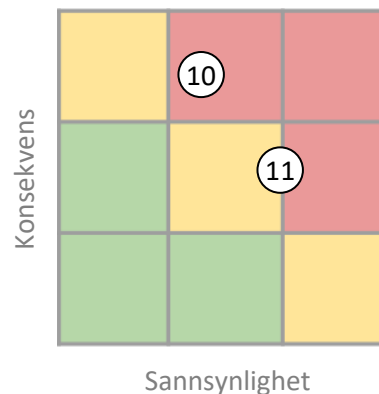

### STØRST RISIKO

10.Sektorbehov blir ikke prioritert hos SKE  
11.Avvikende kommunikasjon fra leverandør og prosjekt til kommune/FK

### TILTAK

R10: Erfaringsnotat med ønske om direkte dialog med produkteier FREG  
R11: Oppfølging kommuner, nettverk og leverandører for avklaring

forrige

i dag

neste

# Endringsforslag 2021-02

## Forlenge prosjektet 6 måneder


Ansvar for innføring var forutsatt utført lokalt i den enkelte kommune med god hjelp av prosjektet i samarbeid med digitale nettverk og leverandører. Resultat er nå at 70 % av kommunene bruker tjenesten, mens 25 % av identifiserte fagsystem vil bruke tjenesten i løpet av 2021.



Prosjektet ser et behov for oppfølging av kommuner og leverandører utover planlagt prosjektperiode. Da det er midler igjen i prosjektet foreslår prosjektet at det forlenges til 30. juni 2022. Dette gjøres ved å legge til en ny delfase i styringsdokumentet (Styringsdokument, kapittel 10.1) og aktiviteten Avslutte prosjekt, flyttes fra 2021 til 2022.

### Anbefaling fra prosjektet:

- Prosjektet anbefaler styringsgruppen om å godkjenne endringsforslaget og forlenger prosjektet til 30. juni 2022 iht. beskrivelsen i endringsforslaget.
- Leveranser: Prioritering av brukstilfeller bestemmer hva som leveres i perioden
  - Maskinell tilgang (maskin-til-maskin) til folkeregisteret
  - Manuell tilgang til folkeregisteret via grafisk grensesnitt (nettsiden)
  - Drift og forvaltning







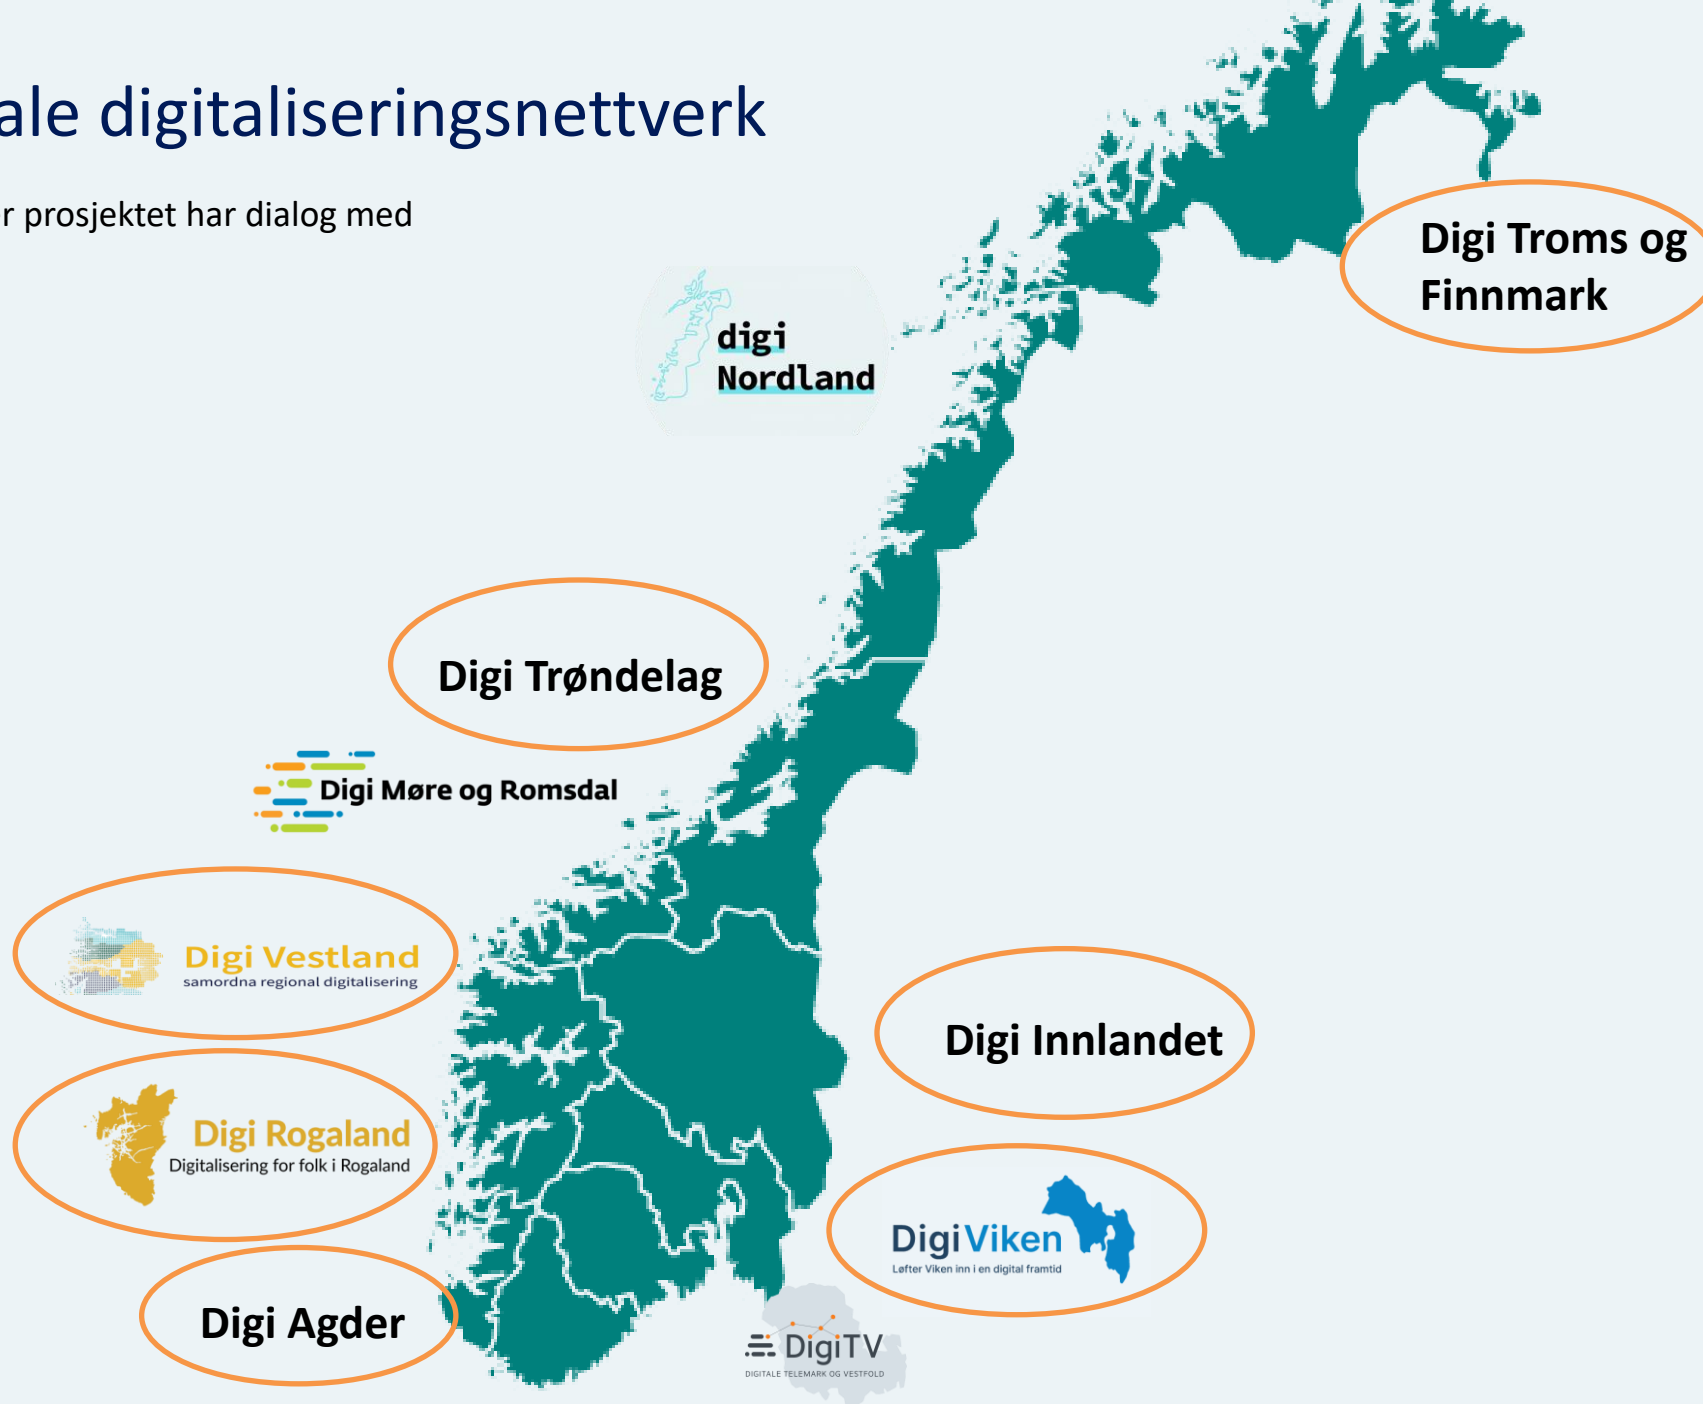









# Regionale digitaliseringsnettverk

 = regioner prosjektet har dialog med



## Oppsummering status fra pilotkommunene

- Nettsiden er i bruk innenfor flere tjenesteområder og brukere gir gode innspill til videre utvikling av tjenesten. Avtaler om bruk av infotorg for ansatte som kun gjør oppslag i folkeregisteret, termineres.
- Leverandøroppfølging er et stort tema som angår mange. Prosjektet vil samarbeide med kommuner/FK og leverandører for å få en bedre oversikt. Spørsmål som må besvares; vil systemet:
  - ta i bruk Fiks folkeregister integrasjon i år?
  - fortsette med integrasjon til Tieto Evry (infotorg) og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
  - fortsette med direkte integrasjon til folkeregisteret og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
  - ikke ha noen integrasjon til folkeregisteret fra nyttår og ta i bruk Fiks folkeregister senere?
- Malene prosjektet legger ut for ROS og DPIA benyttes av kommunene når de gjør interne ROS vurderinger.
- Flere kommuner er nå med på testing av sentral brukerstyring hvor Bodø kommune rapporterer at de har testet løsningen fra ende-til-ende med godt resultat.

Epic	P	OCT – DEC	JAN – MAR '22	APR – JUN '22
	21Q3.1	21Q4.1		
> <a href="#">KSFF-20</a> Informasjon om barn 0-16, med foreldreansvar, som skal starte i barnehage eller skole/SFO				
<a href="#">KSFF-19</a> Oppdatere elevinformasjon for elever under 18 år med foreldreansvar				
> <a href="#">KSFF-36</a> Sentral brukeradministrasjon og SSO				
> <a href="#">KSFF-22</a> Oppfølging av hendelsen når en person i kommunene blir født				
<a href="#">KSFF-21</a> Oppfølging av hendelsen når en person i kommunene dør				
<a href="#">KSFF-27</a> Det er behov får å få jevnlig oppdatering om barn og foreldreansvar				
<a href="#">KSFF-14</a> Velkomst melding til innflyttere til kommunene				
<a href="#">KSFF-13</a> Melding til foreldre med barn < 3 måneder med informasjon om barnehageplass				
<a href="#">KSFF-16</a> Informere innbygger om barn som kan søke om støtte til skoleskys				
> <a href="#">KSFF-291</a> Endringsønsker				
> <a href="#">KSFF-310</a> Kommunene ønsker å gjøre oppslag i flere nasjonale registre fra samme nettside				
> <a href="#">KSFF-31</a> Behov for nye tjenesteområder				
> <a href="#">KSFF-76</a> Forebygge teknisk gjeld				
> <a href="#">KSFF-41</a> Oppfølging av saker i eksternt fagråd				
> <a href="#">KSFF-39</a> Oppfølging av saker med SKE				
<a href="#">KSFF-69</a> Fiks konfigurasjon og Minside har behov for å oppslag i FREG				
<a href="#">KSFF-10</a> SvarUt sjekker strengt fortrolig adresse ved utsendelse				
<a href="#">KSFF-35</a> Informasjon om personer som samles hos KS brukerstøtte				
> <a href="#">KSFF-34</a> Forenklet registrering av rolle til fagsystem				

FERDIG



## Prosjektet ønsker en evaluering av informasjonsmøtene

- Vi har gjennomført 11 møter, det første 8. september 2020
- Med forlengelse av prosjektet til 30. juni 2022 kan vi endre på dialogen
- Vi ønsker derfor tilbakemelding på:
  - Hva fungerer bra med disse møtene som vi tar med oss videre til 2022?
  - Hva fungerer mindre bra som vi ikke tar med oss?
  - Hva savnes som vi skal ta med oss inn i 2022?
- Tilbakemelding direkte til kontaktpersoner i prosjektet (Jens, Børge eller andre)

**Neste møte blir mandag 17. januar 2022**
